

KVALITETSDOKUMENT FÖR EGENKONTROLL AV TÄTSKIKT I VÅTRUM



Projekt: 602665 Kalmar Ort:
Beställare: Smålandsvillan AB Vrigstad GVK-Företag: Flugeby Golv, Färg & Trä AB
Denna egenkontroll avser lgh. nr: trapphus:
Underlag golv: Spackel/spånskiva Underlag vägg: Gips
Tätskikt **GOLV** / Fabr. konstr. Armstrong Våter Elit
Tätskikt **VÄGG** / Fabr. konstr. Armstrong Sliter vägg Horisontell väggsättn. ☒ JA ☐ NEJ
Åtgång vid applicering av vätskebaserat tätskikt:
GOLV: ☐ kg/m² alt. ☐ liter/m² **VÄGG:** ☐ kg/m² alt. ☐ liter/m²

Pos Golv – Tätskikt/plast

- 11 Fogarnas placering
- 12 Fogarnas täthet
- 13 Sockelfogarnas täthet
- 14 Innerhörnens täthet
- 15 Ytterhörnens täthet
- 16 Rör genomföringar
- 17 Anslutning golvbrunn
- 18 Fall
- 19 Uppvik dörrtröskel

1	2

Pos Golv – Tätskikt/klinker

- 31 Försegling golv- och väggvinkel
- 32 Anslutning golvbrunn
- 33 Anslutning tröskel
- 34 Anslutning rör genomföringar
- 35 Tätskiktet
- 36 Fall

1	2

Pos Vägg – Tätskikt/plast

- 21 Fogarnas placering
- 22 Fogarnas täthet
- 23 Överlapp/Aqua Tät
- 24 Limsläpp
- 25 Rör genomföringar

1	2

Pos Vägg – Tätskikt/kakel

- 40 Försegling uppvik
- 41 Försegling skarvar
- 42 Försegling skruvrader
- 43 Försegling innerhörn
- 44 Försegling ytterhörn
- 45 Anslutning rör genomföringar
- 46 Tätskiktet

1	2

Fogar på plastmaterial har täthetskontrollerats med GVK-pumpen (SS 923621) ☐ JA ☒ NEJ
(Avser fogar på golv och vägg samt innerhörn)

Kontroll på andra typer av tätskikt har utförts okulärt.

Kommentarer:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ort, datum:


Vrigstad 30/5-08

Kontroll utförd av:

[Signature]

GVK-behörighetsbevis nr: 5516

BADRUM/PLAN

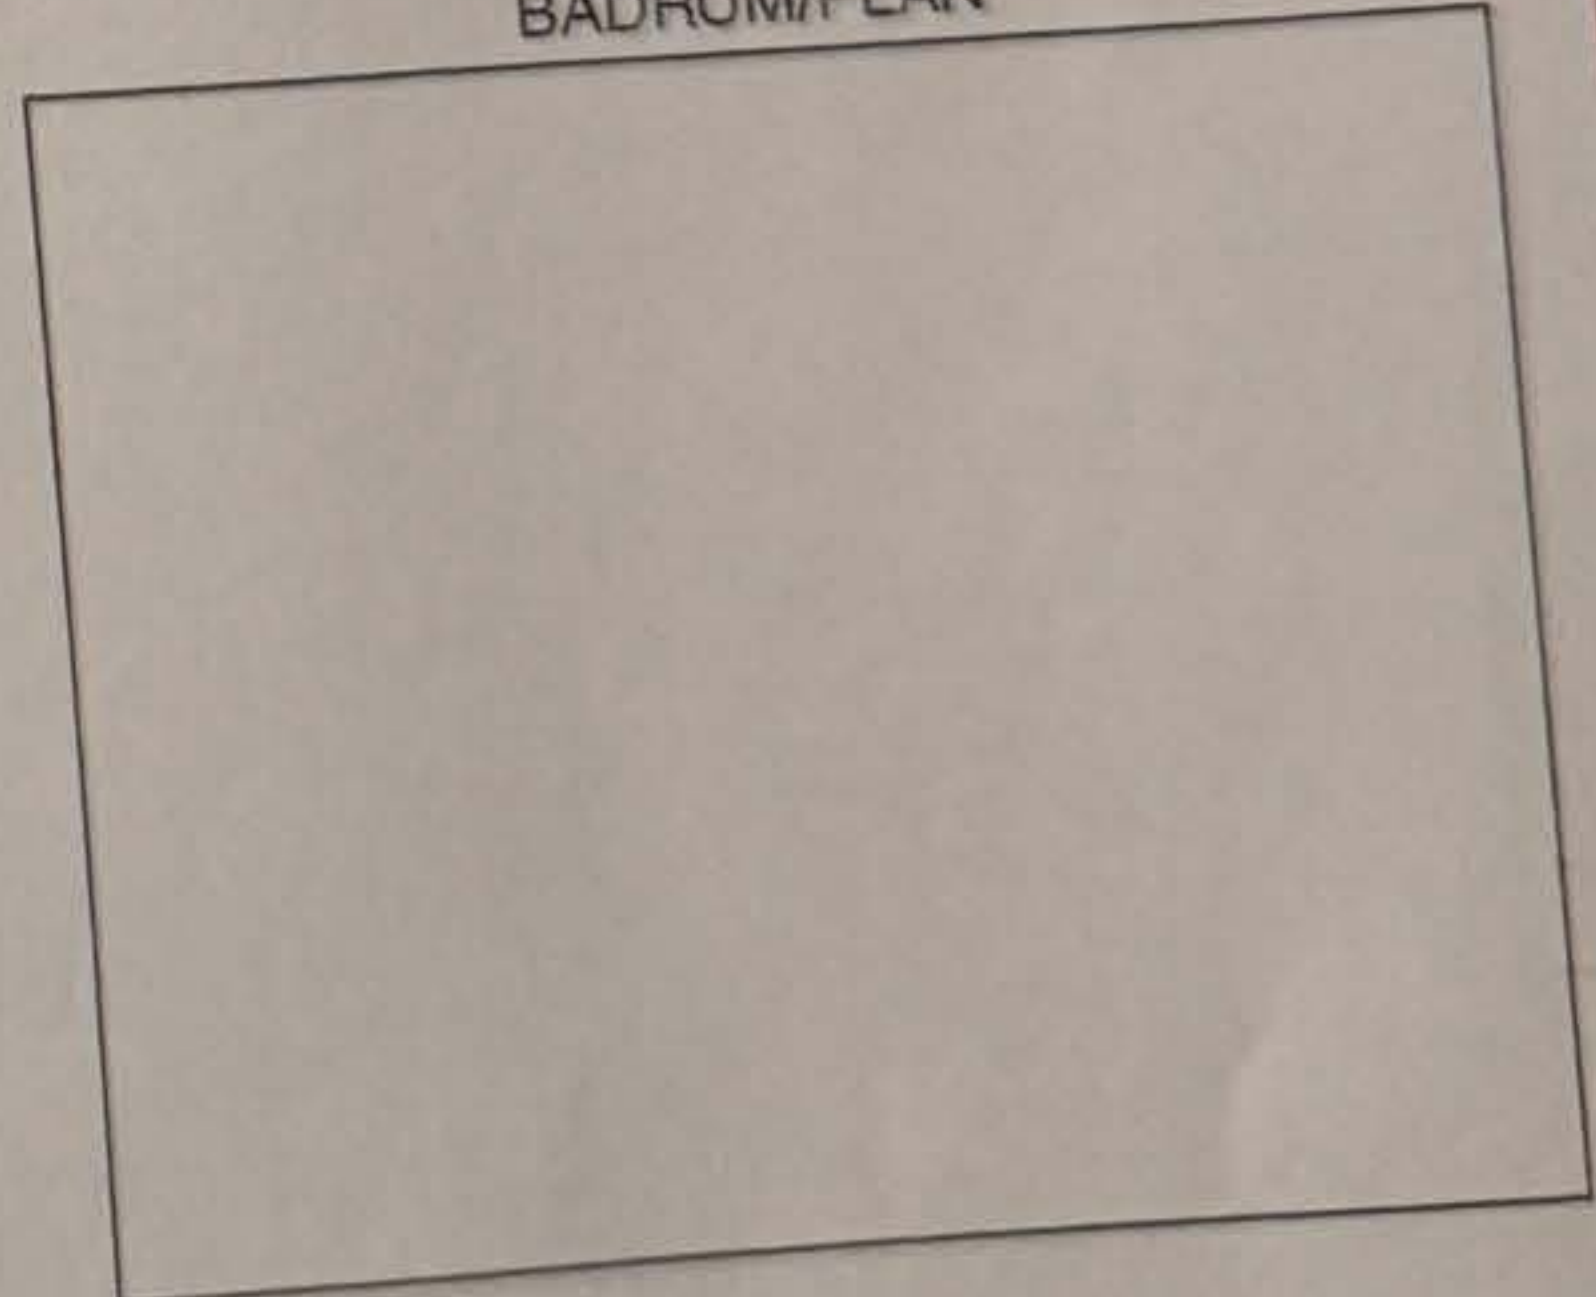

Bilaga A till BBV, Byggherkeramiskrådet's Branschregler för våtrum



Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Byggherkeramiskrådet's Branschregler för våtrum, pkt 11

Behörig entreprenör TB Plattläggning
Byggherkeramiskrådet's behörighetsnummer 250036737 Organisationsnummer 556649-3812
Ansvarsförsäkring Lönförsäkringar försäkringsbolag
Objekt Sötegården 8 plan 2
Beställare _____

Arbetena utförda under tiden: från juli 2011 till juli 2011

Av Byggherkeramiskrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C:

Golv: Tillverkare Hipix Benämning VTGF
Vägg: Tillverkare Hipix Benämning VTVF

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler BBR, BFV 1993:57 med ändringar till och med 2006:12:

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv ☒ Vägg ☒
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav innan tätskikt applicerats.
- ☒ Ny, typgodkänd golvbrunn installerad ☒ Ja ☐ Nej
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad och korrekt placerad i våg och höjd.
- ☒ Arbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning från tätskiktstillverkaren.
- ☒ Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggherkeramiskrådet's Branschregler för Våtrum, BBV

Våtrumsansvarig
arbetsledare: Tommy Buhaj Namnteckning Tommy Buhaj
Ort och datum Huskrarna 22/7-11 Namnförtydligande _____

Dokumentet avser 1 våtrum. Se 11.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☐ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☐ Nyttjare/Boende ☐ Behörigt företag
